СОГЛАСОВАНО:
Начальник МКУ "УКХ г. Орла"
Писарев Ю.Н.

_____
"_____"_____**2022г.**

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОО "ГазРесурс"
Соколов В.А.

Общество с ограниченной ответственностью ИНН 3663054435 ОГРН 1163668063900 «ГАЗ РЕСУРС» город Воронеж

График производства работ

по объекту: "Ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул.Ломоносова"

8,93 Р
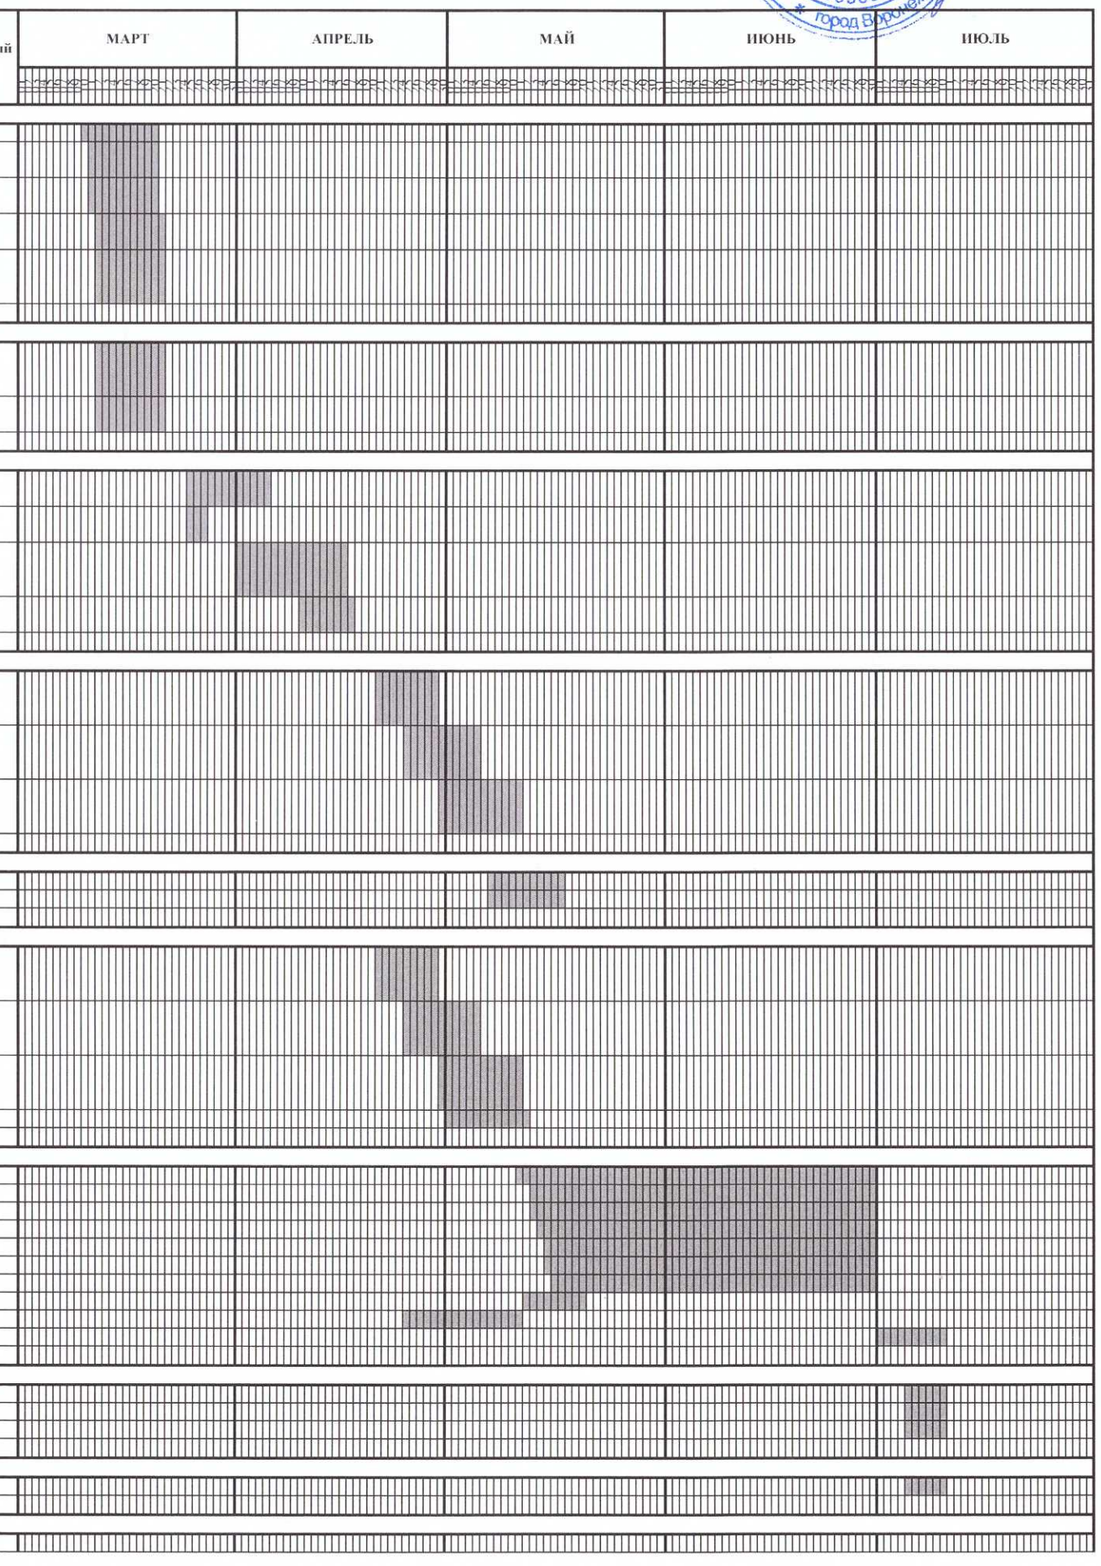
Наименование работ	Ед. изм.	План по контракту	Стоимость работ по контракту, руб	Стоимость за единицу, руб	Цена работ за сутки, руб	Дата начала работ	Дата окончания работ	Кол-во дней	Суточный успех
Раздел 1. Подготовительные работы									
Валка деревьев в городских условиях:диаметром до 120 см	м3	400,20	497 197,90 Р	1 242,37 Р	45 199,81 Р	10.03.2022	20.03.2022	11	36
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	шт	25,00	4 772,57 Р	190,90 Р	477,26 Р	11.03.2022	20.03.2022	10	3
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	м2	885,00	5 902,90 Р	6,67 Р	590,29 Р	11.03.2022	20.03.2022	10	89
Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	га	0,0885	206,27 Р	2 330,72 Р	20,63 Р	12.03.2022	21.03.2022	10	0
Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см	шт	77,00	3 199,00 Р	41,55 Р	319,90 Р	12.03.2022	21.03.2022	10	8
ВСЕГО:			**511 278,63 Р**						
Раздел 2. Утилизация									
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	282,42	8 268,07 Р	29,28 Р	826,81 Р	12.03.2022	21.03.2022	10	28
Утилизация древесных отходов (отходы V класса - прочие) с учетом доставки	м3	470,7	134 620,84 Р	286,00 Р	13 462,08 Р	12.03.2022	21.03.2022	10	47
ВСЕГО:			**142 888,91 Р**						
Раздел 3. Демонтажные работы									
Разборка бортовых камней: на бетонном основании с погрузкой и перевозкой	м	2158,00	518 978,68 Р	240,49 Р	43 248,22 Р	25.03.2022	05.04.2022	12	180
Демонтаж металлических пешеходных ограждений с погрузкой и перевозкой	м	46,00	3 750,51 Р	81,53 Р	1 250,17 Р	25.03.2022	27.03.2022	3	15
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических с погрузкой и перевозкой	м2	1534,00	54 391,44 Р	35,46 Р	3 399,46 Р	01.04.2022	16.04.2022	16	96
Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи с погрузкой и перевозкой	м	10,00	7 151,49 Р	715,15 Р	893,94 Р	10.04.2022	17.04.2022	8	1
ВСЕГО:			**584 272,11 Р**						
Раздел 4. Дорожная одежда									
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм м перевозкой до 15 км	м2	5736,00	181 840,44 Р	31,70 Р	20 204,49 Р	21.04.2022	29.04.2022	9	637
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей Б II асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	м2	5736,00	2 741 837,09 Р	478,01 Р	249 257,92 Р	25.04.2022	05.05.2022	11	521
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-15 асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см	м2	5736,00	4 420 066,01 Р	770,58 Р	368 338,83 Р	30.04.2022	11.05.2022	12	478
ВСЕГО:			**7 343 743,54 Р**						
Раздел 5. Искусственные сооружения									
Восстановление водоотводных лотков BetoMax	шт	9,00	544 834,41 Р	60 537,16 Р	49 530,40 Р	07.05.2022	17.05.2022	11	1
Ремонт смотровых колодцев на проезжей части и тротуаре	шт	26	165 330,09 Р	6 358,85 Р	15 030,01 Р	07.05.2022	17.05.2022	11	2
ВСЕГО:			**710 164,50 Р**						
Раздел 6. Пересечения, примыкания и парковки									
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм	м2	3994,00	106 417,97 Р	26,64 Р	11 824,22 Р	21.04.2022	29.04.2022	9	444
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей Б II асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	м2	3994,00	1 909 234,64 Р	478,03 Р	173 566,79 Р	25.04.2022	05.05.2022	11	363
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-15 асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см	м2	3994,00	3 037 110,33 Р	760,42 Р	253 092,53 Р	30.04.2022	11.05.2022	12	333
Восстановление дорожной одежды	м2	700,00	1 515 917,54 Р	2 165,60 Р	126 326,46 Р	01.05.2022	12.05.2022	12	58
ВСЕГО:			**6 568 680,47 Р**						
Раздел 7. Дорожные устройства и обустройство дороги									
Восстановление тротуара	м2	2710,00	4 498 556,46 Р	1 659,98 Р	88 206,99 Р	11.05.2022	30.06.2022	51	53
Ремонт покрытия из плитки	м2	1534,00	2 271 352,75 Р	1 480,67 Р	46 354,14 Р	13.05.2022	30.06.2022	49	31
Тактильная плитка	м2	10,00	13 416,05 Р	1 341,60 Р	273,80 Р	13.05.2022	30.06.2022	49	0
Восстановление велосипедных дорожек	м2	1523,00	1 524 257,46 Р	1 000,83 Р	31 755,36 Р	14.05.2022	30.06.2022	48	32
Замена и устройство недостающих бортовых камней	м	5603,00	4 573 626,55 Р	816,28 Р	97 311,20 Р	15.05.2022	30.06.2022	47	119
Восстановление металлического пешеходного ограждения	м	194,00	393 477,76 Р	2 028,24 Р	8 371,87 Р	15.05.2022	30.06.2022	47	4
Благоустройство (озеленение территории)	м2	15240,00	3 975 314,23 Р	260,85 Р	86 419,87 Р	16.05.2022	30.06.2022	46	331
Дорожная разметка	км	0,64	237 917,55 Р	373 496,94 Р	26 435,28 Р	12.05.2022	20.05.2022	9	0
Временная дорожная разметка (краска)	км	0,69	41 780,29 Р	60 551,15 Р	2 457,66 Р	25.04.2022	11.05.2022	17	0
Дорожные знаки	шт	85,00	450 528,02 Р	5 300,33 Р	45 052,80 Р	01.07.2022	10.07.2022	10	9
ВСЕГО:			**17 980 227,12 Р**						
Раздел 8. Освещение									
Установка опор наружного освещения композитных фланцевых	шт	2	192 657,02 Р	96 328,51 Р	32 109,50 Р	05.07.2022	10.07.2022	6	0
Подключение провода к существующим опорам	шт	4	10 722,59 Р	2 680,65 Р	1 787,10 Р	05.07.2022	10.07.2022	6	1
Осветительные приборы	шт	38,00	658 600,40 Р	17 331,59 Р	109 766,73 Р	05.07.2022	10.07.2022	6	6
ВСЕГО:			**861 980,01 Р**						
Раздел 9. Светофор									
Монтаж и обустройство светофора	шт	1,00	494 715,71 Р	494 715,71 Р	82 452,62 Р	05.07.2022	10.07.2022	6	0
ВСЕГО:			**494 715,71 Р**						
Раздел 9. Светофор									
ИТОГО:			**35 197 951,00 Р**
